

計画者	特定非営利活動法人 かむい			
担当者	氏名	濱田 耕二	電子メール	koji-hamada@npokamui.org
			電話番号	080-6098-3543
対象箇所	赤岳第3花園及び第2花園及び展望台			
登山道管理水準	保全対策ランク	A・ ③ ・C・D	利用体験ランク (大雪山グレード)	1・2・ ③ ・4・5
作業の目的	雪解け水、雨水により洗掘し、歩きづらくなってきているので、違うところを歩き複線化や拡幅してきている。その為雨水を分散して歩きやすくしてこれ以上の複線化を防ぎ植生の回復を促す。			
利用する工法	分散排水工	床止工	土留工	マルチング工
	路面処理工	段差処理工	植生基盤工	その他()
作業予定日時又は期間	9月1日から14日		参加予定人数	5名
			参加者内訳	参加者の一般公募 ●: 実施する : 実施しない
安全対策 (保険の適用、連絡網の整備等)	職員は労災保険適用			
主な資材とその調達 (予定)	資材	数量	調達方法	
	丸太1m80cm	200	現地採取/搬入(計画者の自己資金・寄付) その他	
	カスガイ	500	現地採取/搬入(計画者の自己資金・寄付) その他	
	石		現地採取/搬入(計画者の自己資金・寄付) その他	
			現地採取/搬入(計画者の自己資金・寄付) その他	
道具の貸し出し希望 (自然保護官事務所・森林管理署)	物品	数量	希望先	貸出予定日時
				返却予定日時
位置図(地形図、国立公園の公園計画図、国有林又は道有林の施業計画図など)				
事務局記入欄				
国立公園	保護規制計画:	特別保護地区		
	利用施設計画:	銀泉台白雲寺線道路(中道)		
	事業執行者:	北海道	担当部署:	上川総合振興局
土地所有	国有林・道有林・その他()			担当部署:
天然記念物	該当あり・該当なし			担当部署:
備考				

課題(問題点・作業の必要性)／ねらい・目標
登山道がドロドロべちゃべちゃなので、年々複線化及び拡幅化している


施工方法



備考

課題(問題点・作業の必要性)／ねらい・目標
丸太を固定して石を詰めて床止めを行う。法面や複線化した箇所はネットで保護し、植生の回復を促す。

施工方法

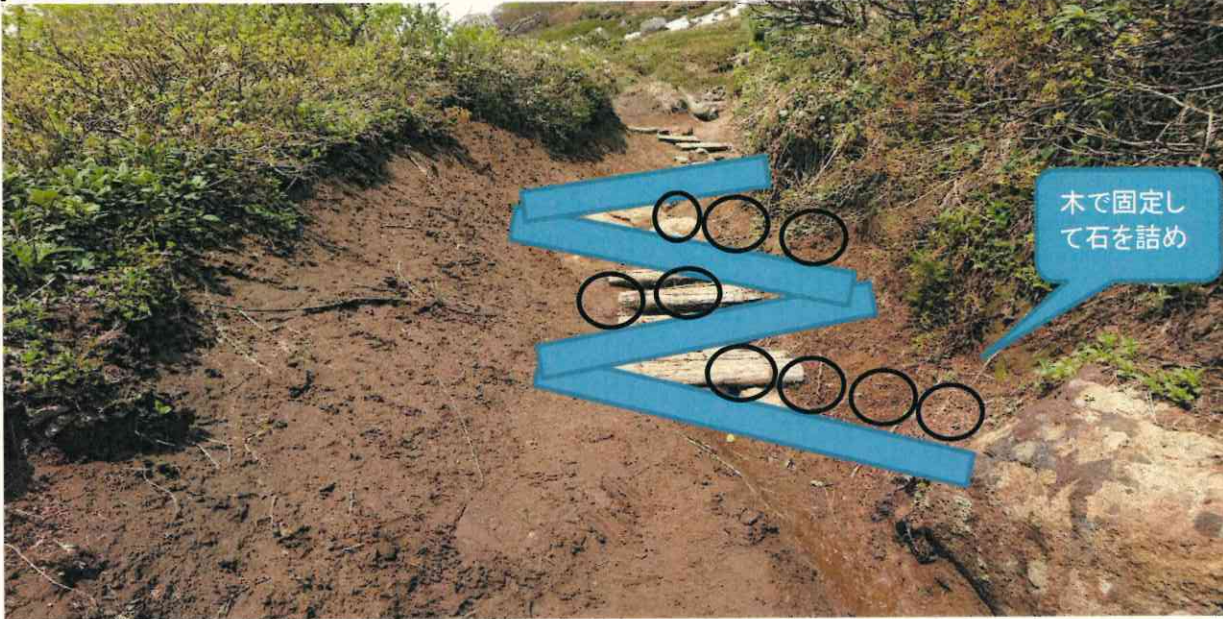

備考

課題(問題点・作業の必要性)／ねらい・目標
雪解け時期及び大雨時には登山道に吐ききれないほどの水が流れ川になってしまうので、流路を作り水量を分散させ、且登山者の導線を作る。

施工方法



備考
